



vzw AIB-VINÇOTTE BELGIUM asbl
 Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
 tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@aib-vincotte.be • www.aib-vincotte.com
 Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels
 Safety, quality and environmental services

Apr 23 / 2006

AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
 AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11
 AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
 AV Wallonie : Tel.: 081 432 611

Code PC Resi. 1

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:
 Naam, Voornaam: E. Leclercq Verkele
 BTW nr: 869 516 314
 of identiteitskaartnr: _____
 Stroomleverancier: _____
 Meter nr: 5179193 stand: 60
 Wijze van meting: dag - tweevoudig - nachttarief -
 VERSLAG nr: 103000030/GEN
 Lid nr: _____
 Installatie Naam: Vario De Goma
 Adres: Nieuwpoortsesteenweg 57
8400 Oostende
 Datum onderzoek: 28/2/2006
 Eigenaar of aangestelde: Tel.: _____
 Naam, Voornaam: idem
 Adres: _____
 Aanvrager: Verkele

Type van bezoek: 270 271 276 AREI Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding Wijziging Bestaande Tijdelijke
 Onderzoek volgens de voorschriften van: AREI art. 86 87 88 95 ARAB _____
 Installatie ontworpen voor een spanning van 230V AC, Bescherming aansluiting: 40 A Type: AVK
 Omschrijving aansluiting: Dg 10g Kabeltype: EXUR Doorsnede: 4 x 25 mm²
 Voeding hoofdbord: 1 x 16 mm² Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 16
 Type aardelektrode: bus Spreidingsweerstand: 274 Ohms Algemeen isolatieniveau: 40 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag.

<u>Alg diff 40A / 0,3 nie te kansen</u>		

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)
geen inbreuken vastgesteld
Open: lekken en kortsluiting mag niet geïnterpreteerd

De hoofddifferentieel was werd - (niet) - gelood.
 De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden voor 230V evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.


Besluit:
 DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE IS IS-NIET- CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
 DE INSTALLATIE WAS MAG MAG NIET- ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

De installatie moet voor _____ opnieuw gekeurd worden.
 Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: tekens
 VISUM VAN DE STROOMVERDELER:
 Voor de directeur-generaal
 Naam, Agentnr., Handtekening: DESMET BART
3000
3000

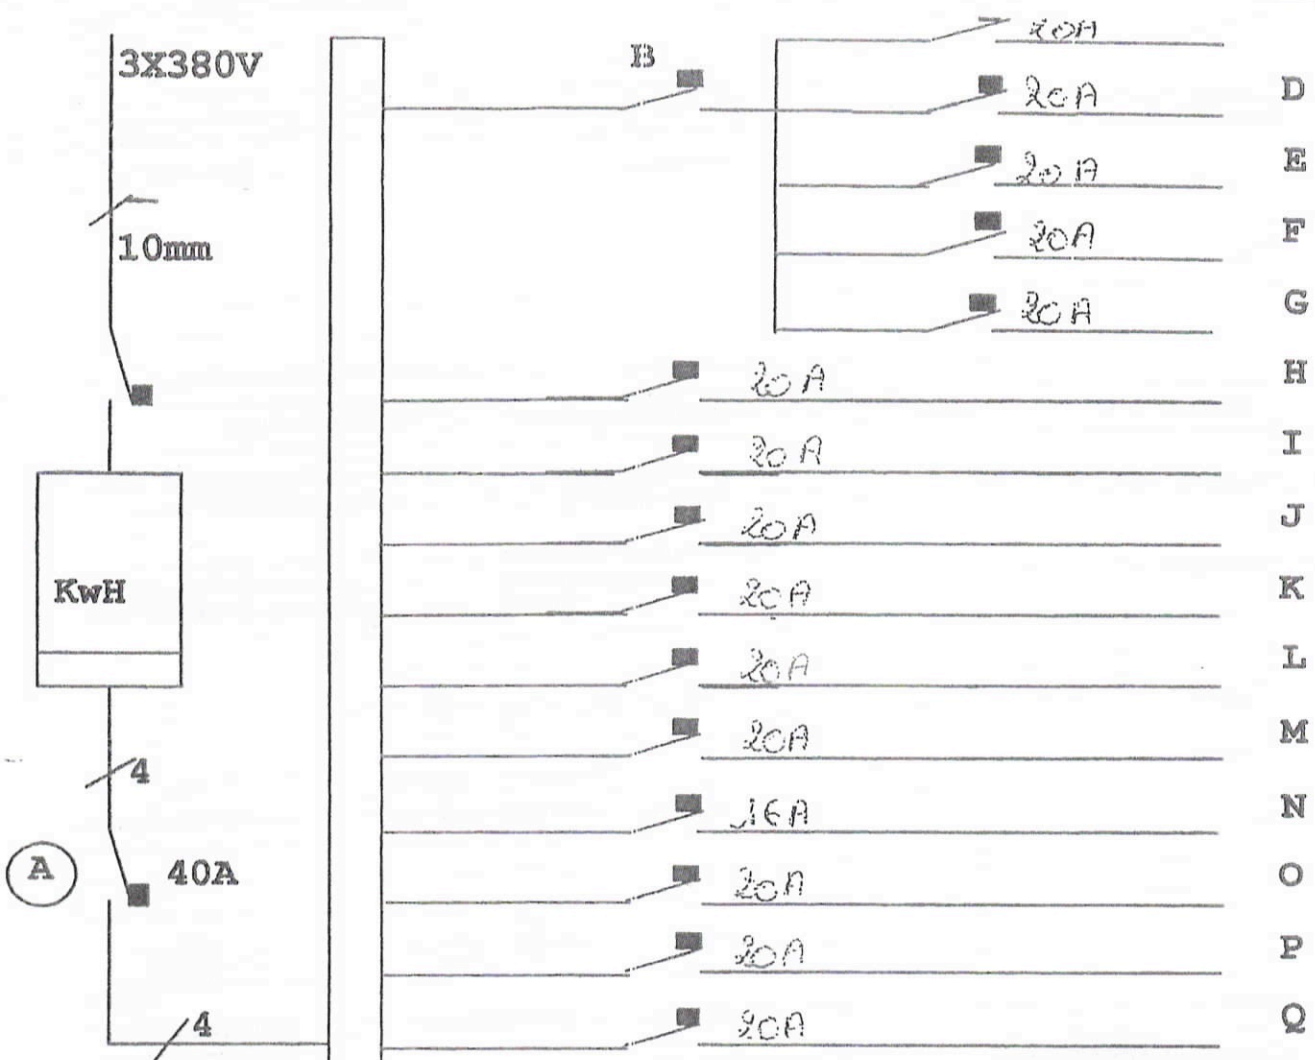

Case 203

